

46954

O/H. M2


CD Preacendi

RECONDICIONAMIENTO CANAL SECUNDARIO LA LOQUITA

Y

PRINCIPAL LA LOCA

Progresiva 6+000 a 5+600



MAYO 1993

CONVENIO BILATERAL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - PROVINCIA DE SANTA FE


NOTA INTERNA Nro. 006 / 993

SANTA FE, 1 JUN 1993

SENORA DIRECTORA:

Se eleva para su conocimiento y a los fines que corresponda, los cálculos métricos de la obra: REACONDICIONAMIENTO CANAL SECUNDARIO LA LOQUITA Y PRINCIPAL LA LOCA, desde Progresiva 6+000 a 5+600, de los trabajos realizados en el mes de Mayo de 1993.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.


Téc. MIGUEL A. CABRE
Inspector de Obras
Direc. Prov. de Obras Hidráulicas
M. O. S. P. Y V

SENORA DIRECTORA DEL
CONVENIO BILATERAL CFI - PCIA. DE SANTA FE
Ing. Agr. NELIDA I. LOZANO
S _____ / _____ D

OBRA: Contratación de equipos para Movimiento de Suelo
Canal Secundario La Loquita y Ppal. La Loca - Depto. Vera

RESOLUCION Nro. : 00166 (20-4-92 - M.O.S.P. y V.)

COMITENTE : Comité de Cuenca Laguna La Loca

EMPRESA : Trossero S.A.

Santa Fe, 1 de junio de 1992.

Por la presente se deja expresa constancia que durante Mayo de 1993, se ejecutaron desde Progresiva 6+000 a Progresiva 5+600 , la cantidad de 2.978 m3 de excavación.

Se adjuntan a la presente Planos de perfiles transversales y Cómputos métricos de excavación.


MIGUEL A. CABRE
Inspector de Obra

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS DE EXCAVACION

OBRA: Contratacion de equipos para Movimiento de Suelo
 Canal Secundario La Loquita y Ppal. La Loca - Vera

RESOLUCION Nro. 00166 DEL 20-4-92 (M.O.S.P.y V.)

COMITENTE : Comite de Cuenca Laguna La Loca

EMPRESA : Trossero S.A.


Trabajos efectuados durante el mes de mayo de 1993.













CERTIFICADO Nro. 9

Progresiva (Km)	Desmorte	Seccion (m2)	Seccion Media (m2)	Dist. (m)	Volumen (m3)	
					Parcial	Acumulado
6+000		7.10	0.000		0.00	0.00
5+900		7.50	7.300	100	730.00	730.00
5+800		7.10	7.300	100	730.00	1460.00
5+700		8.20	7.650	100	765.00	2225.00
5+600		6.85	7.530	100	753.00	2978.00

VOLUMEN TOTAL EXCAVADO = 2.978 m3

Santa Fe, 1 de Junio de 1993.


 MIGUEL A. CARRÉ
 Inspector de Obra

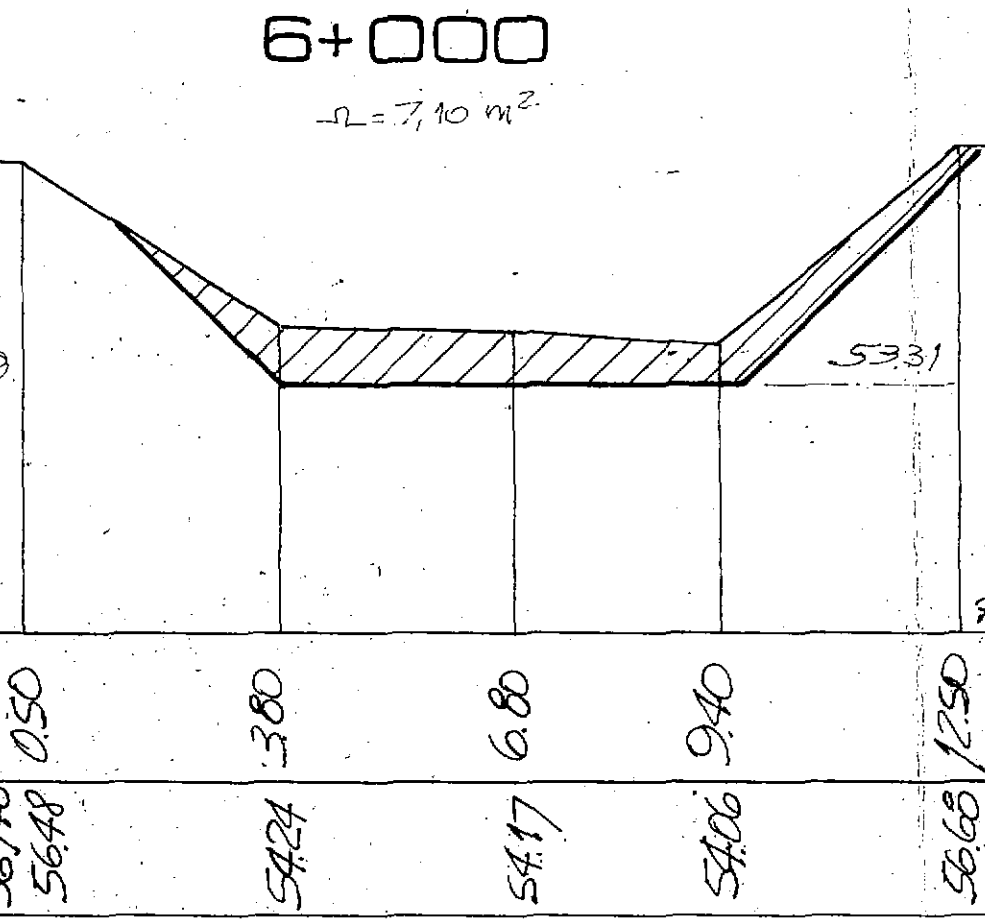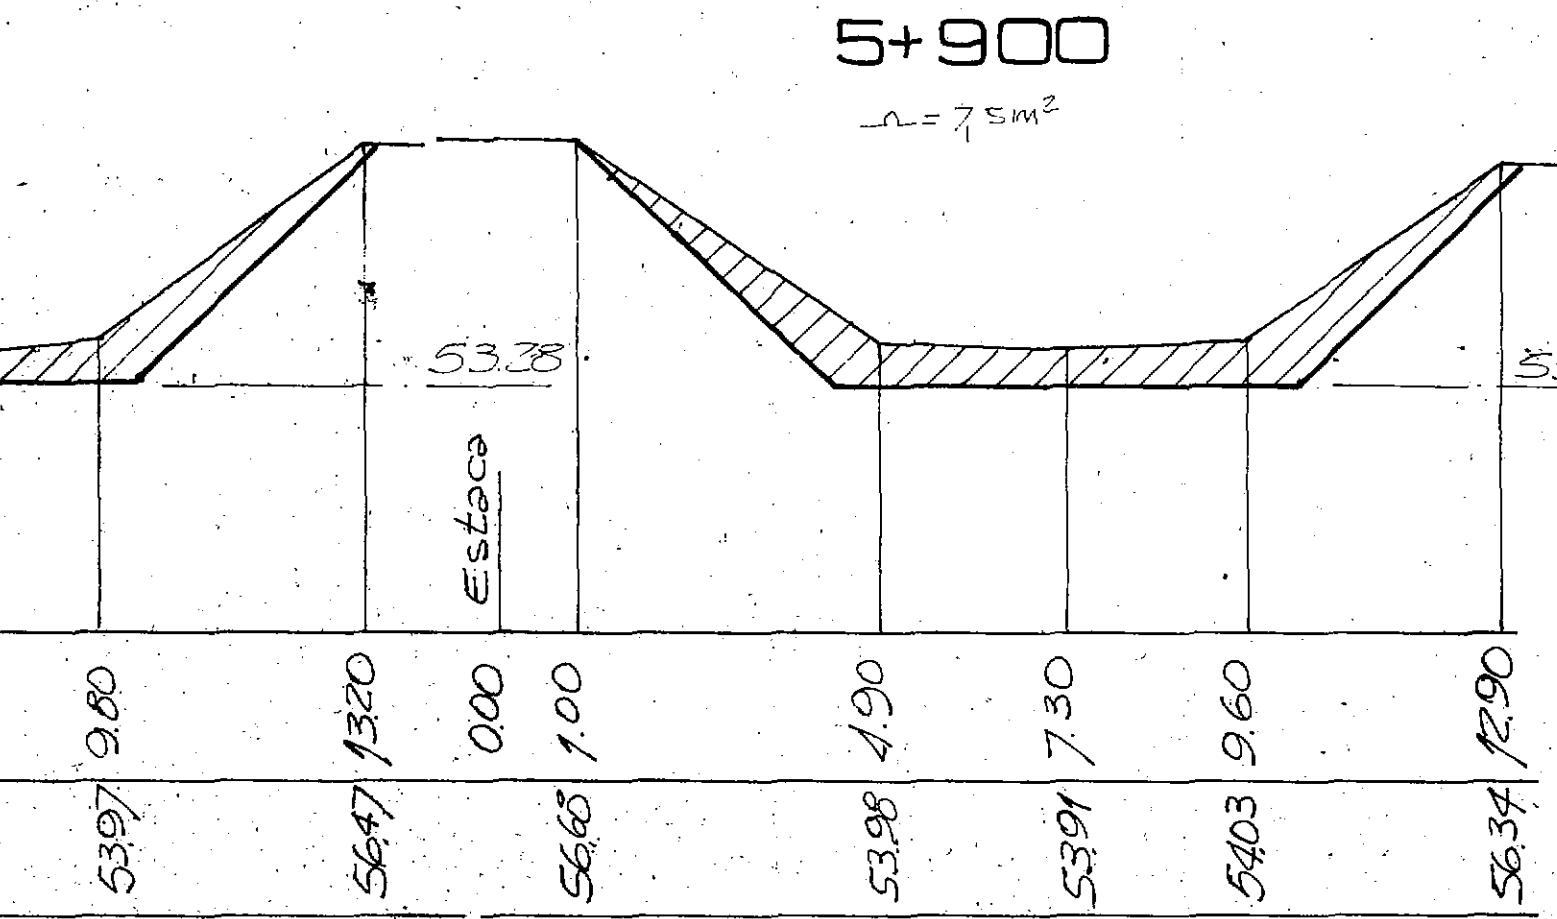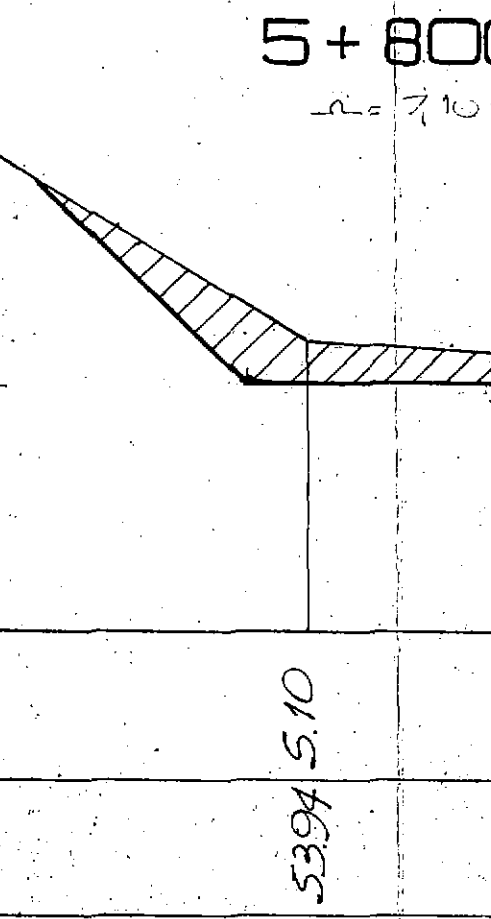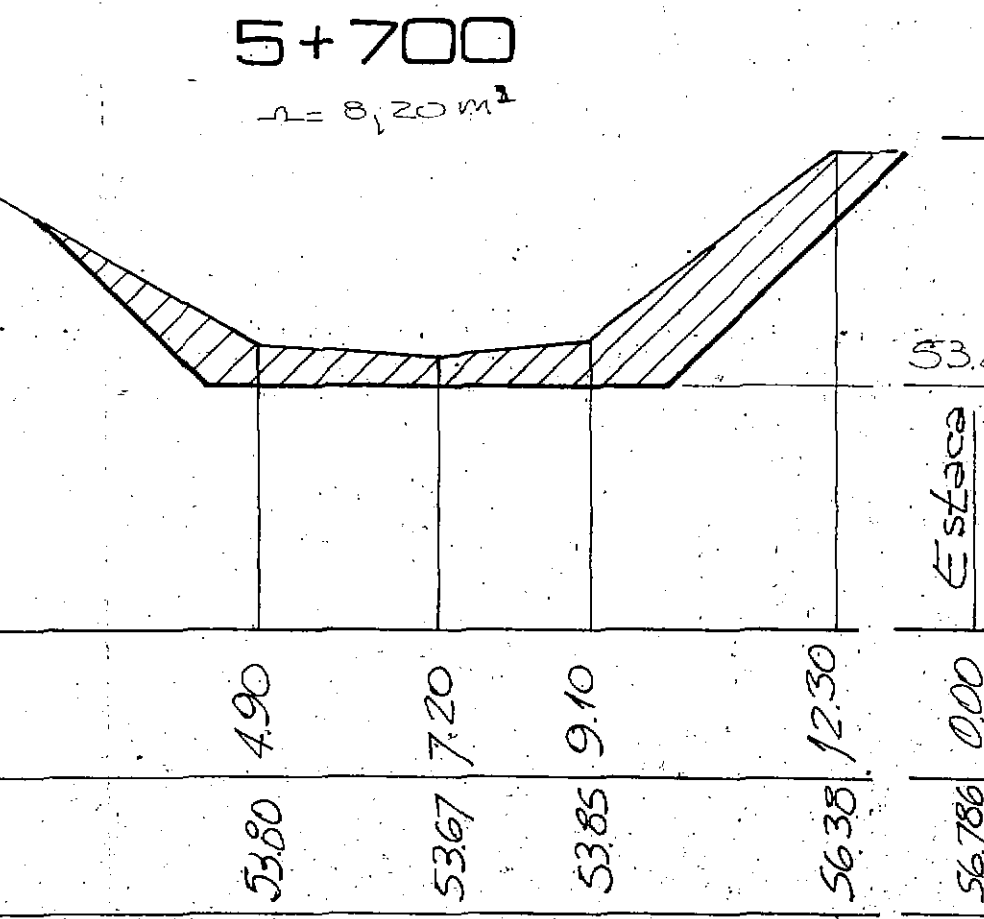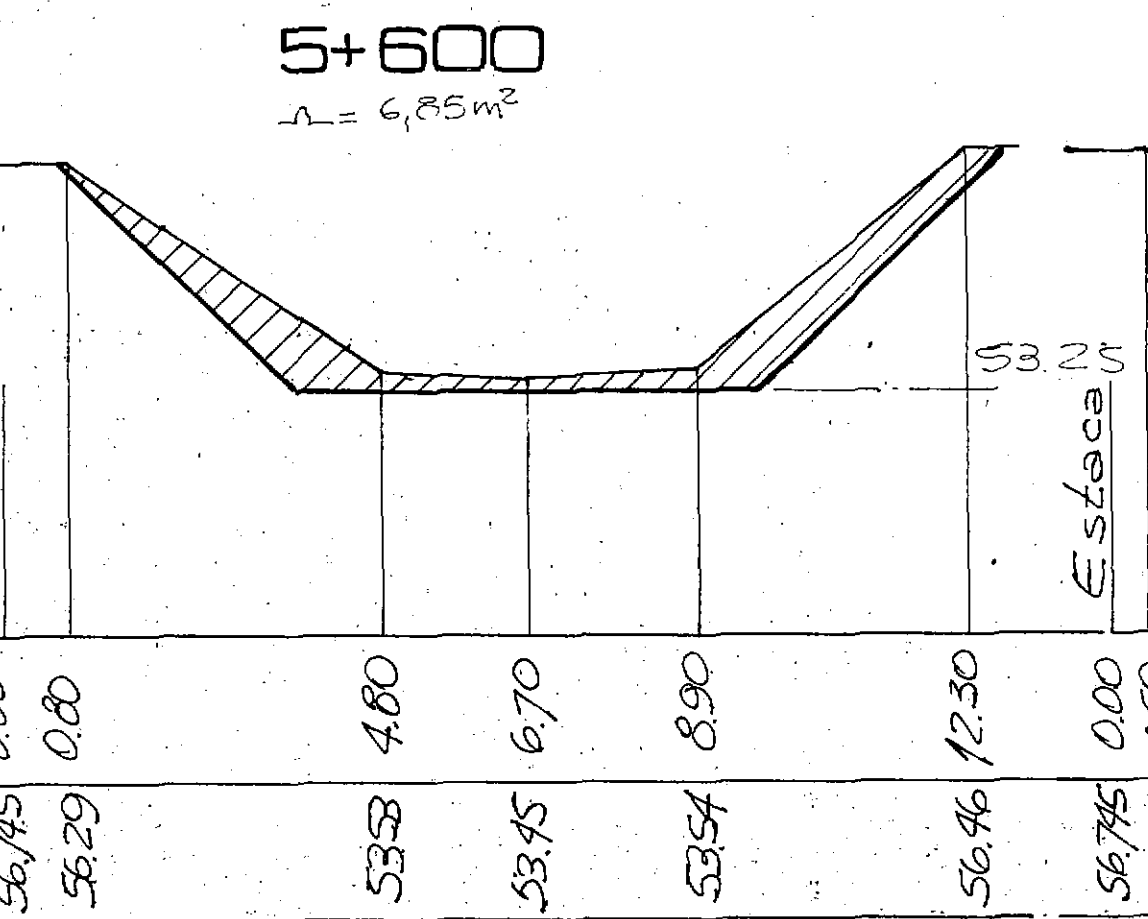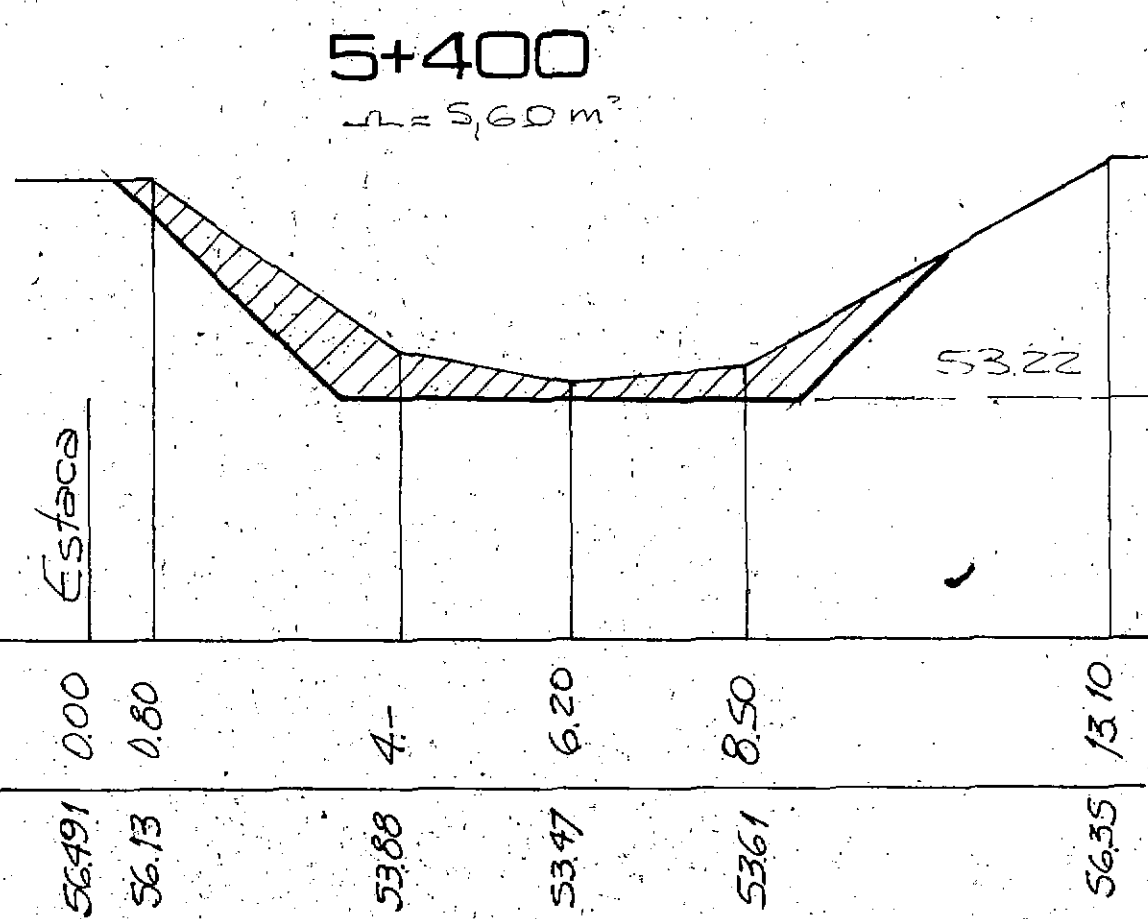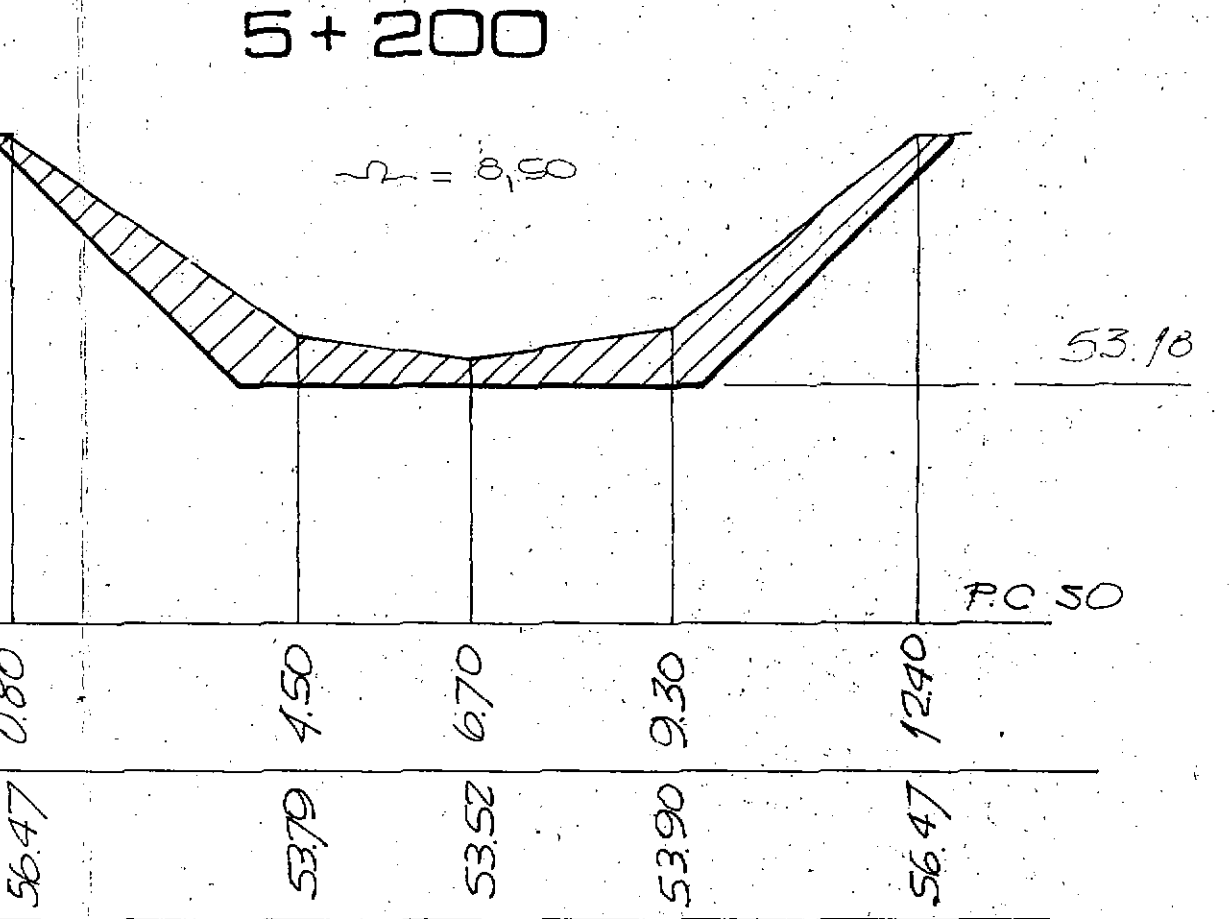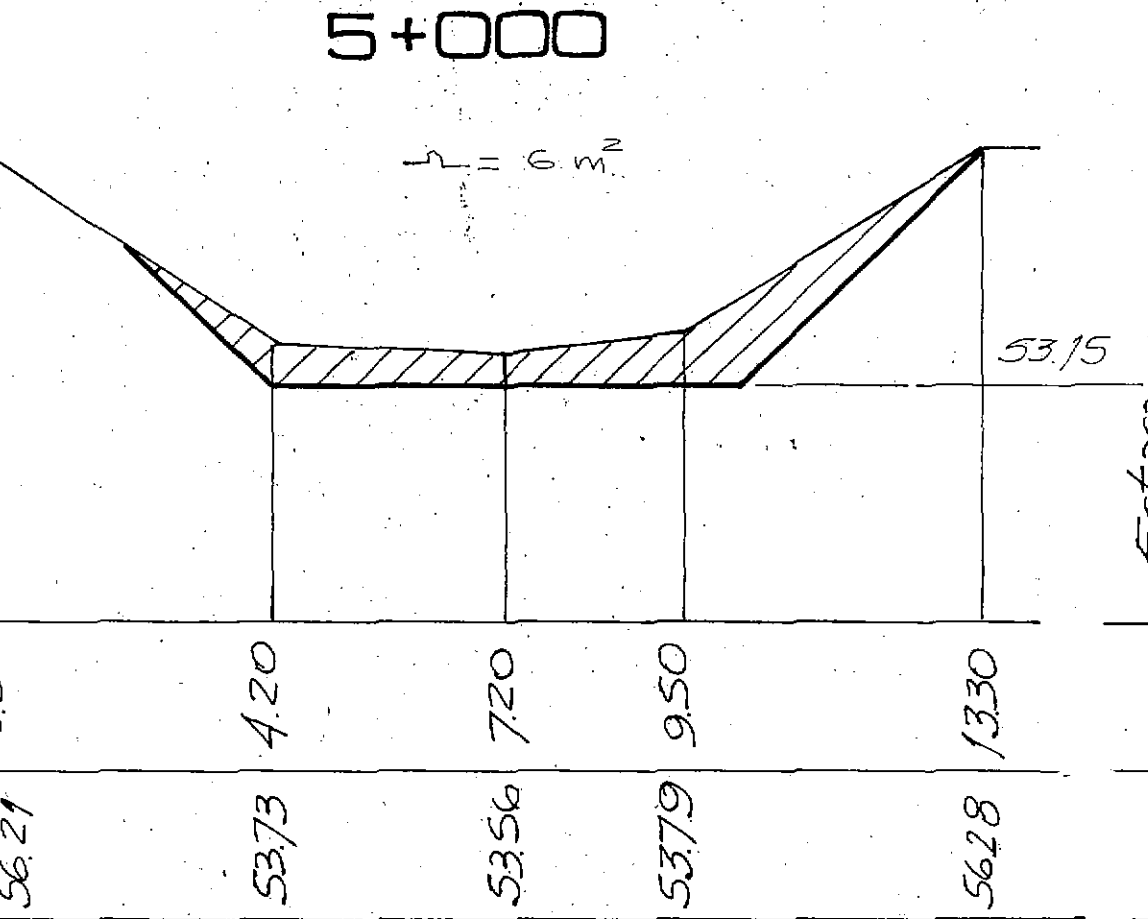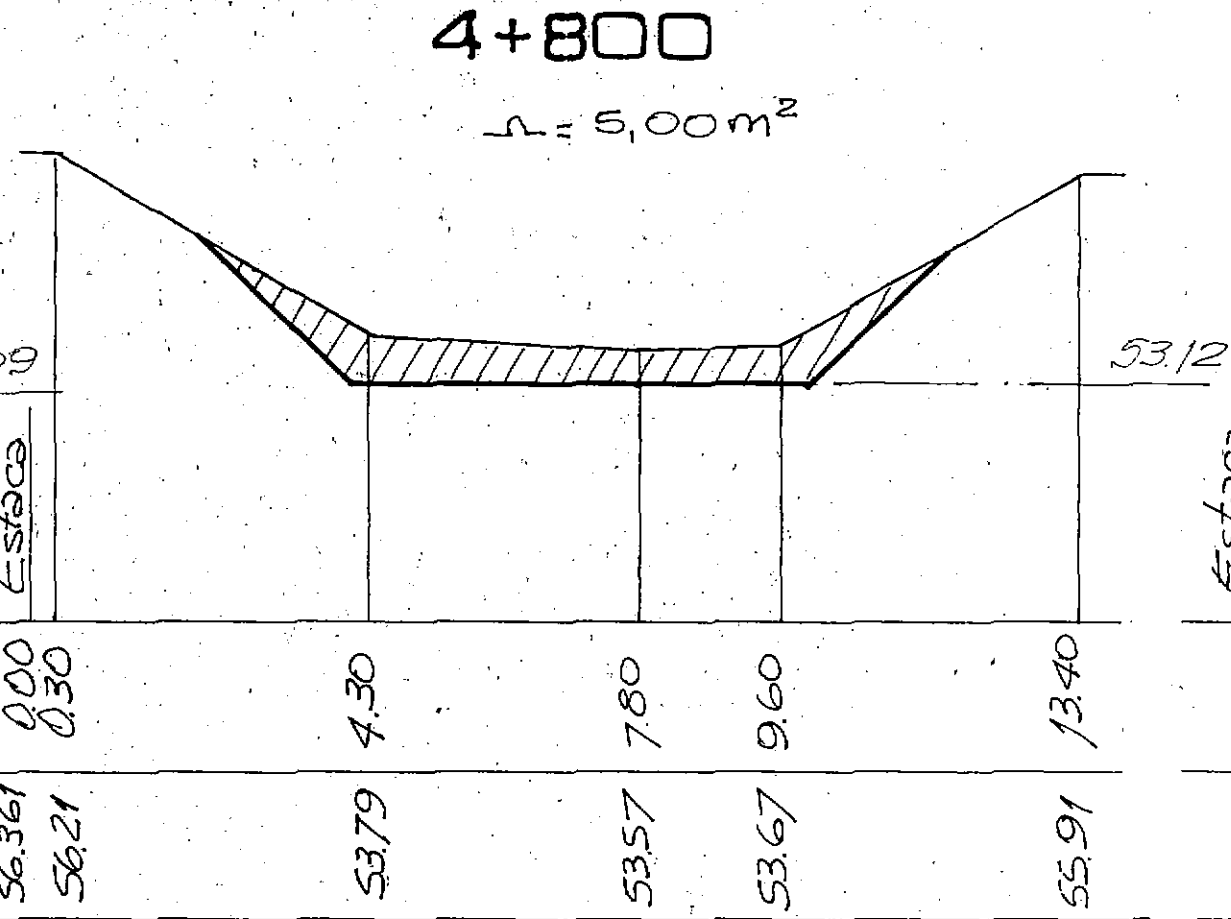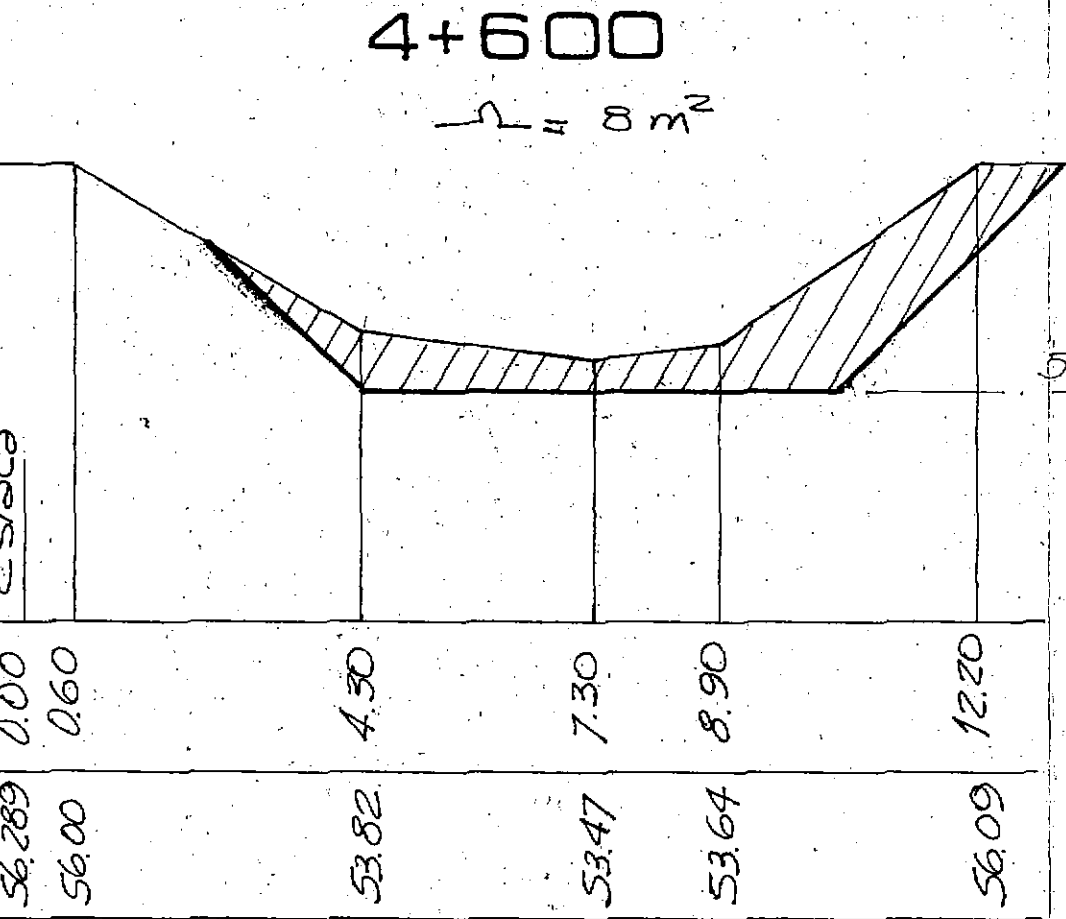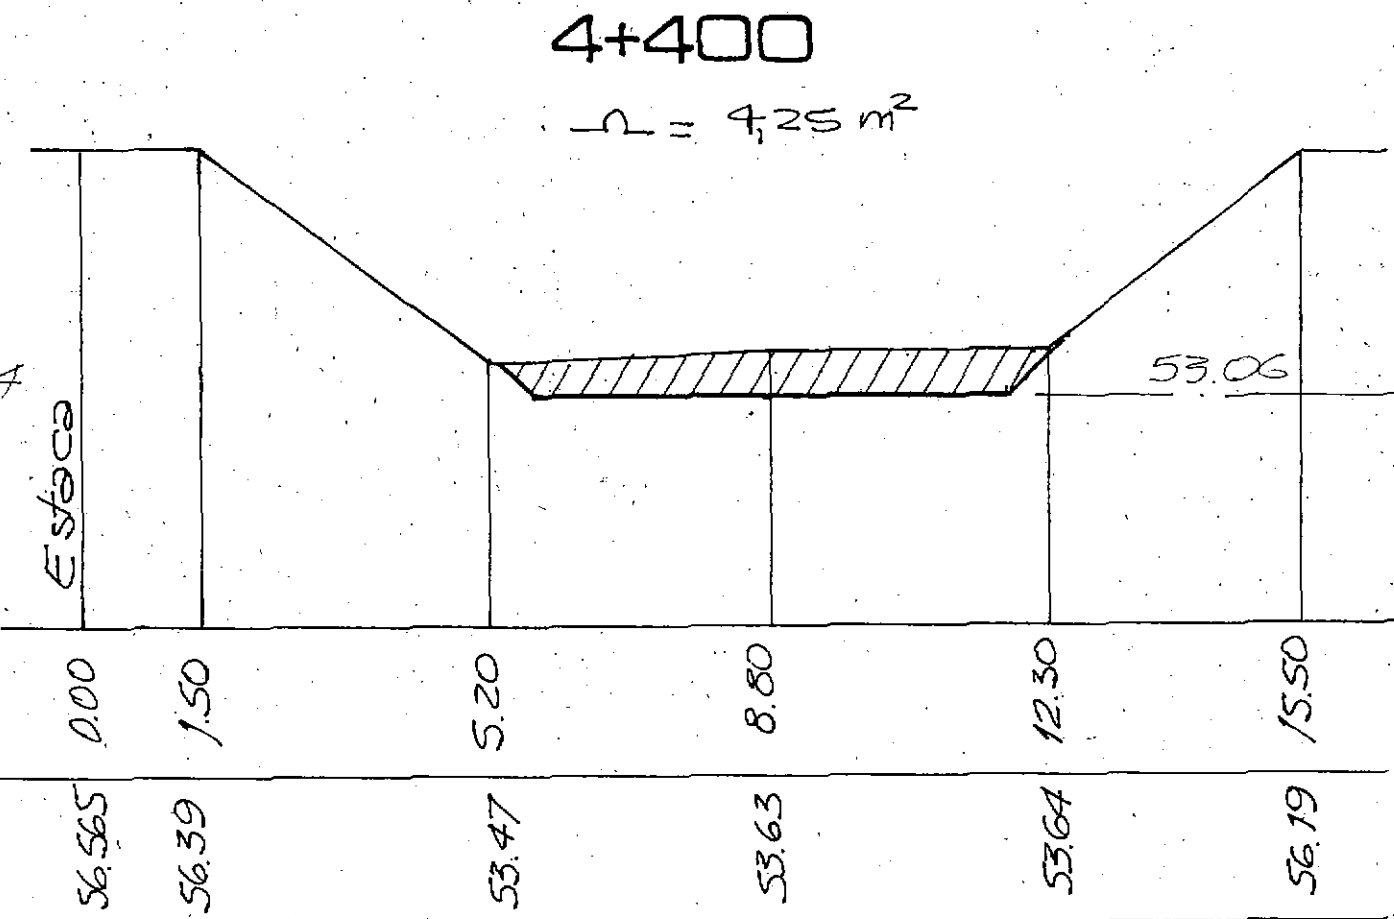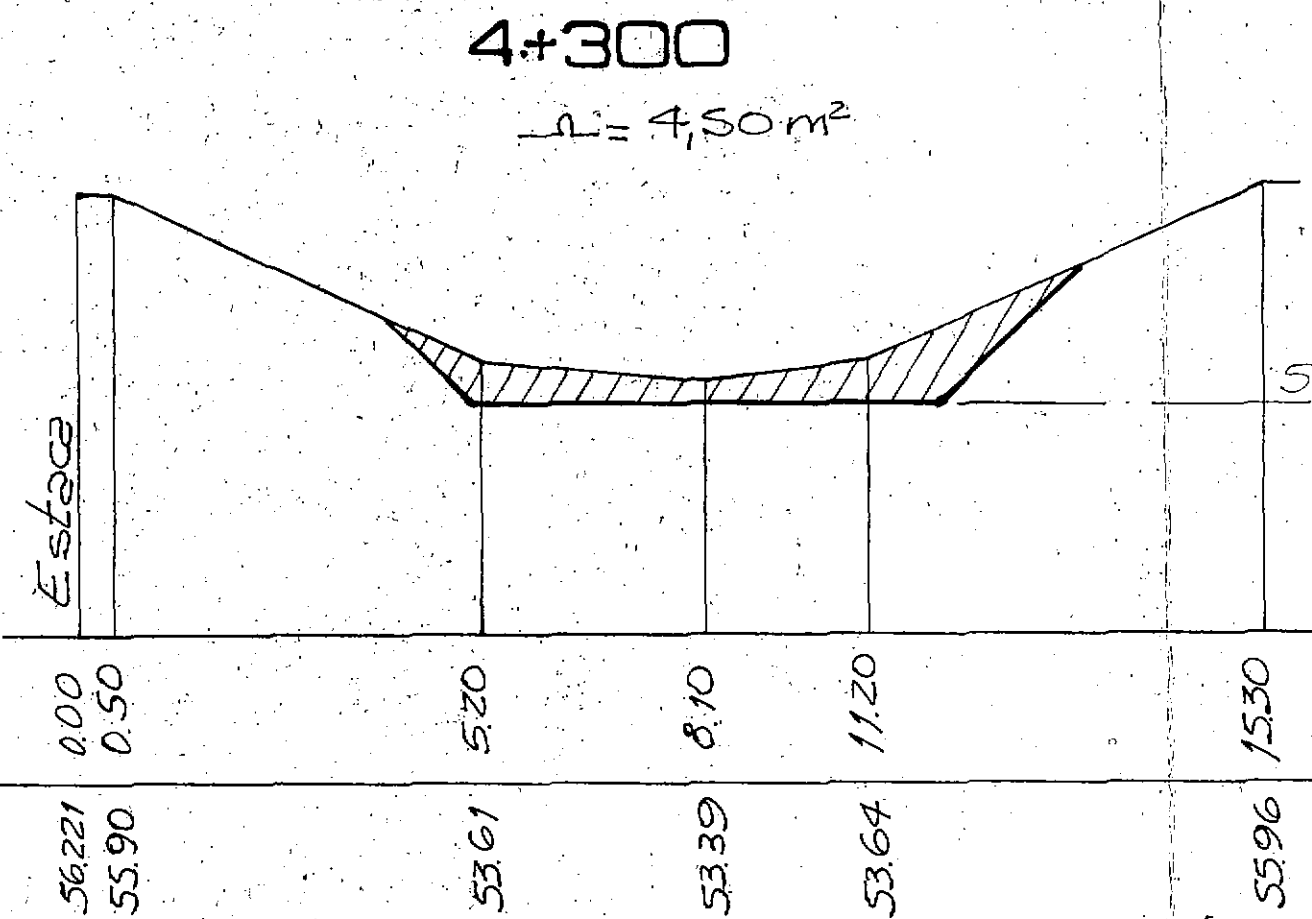

**REACONDICIONAMIENTO
CANAL SEC. LA LOQUITA**

DESDE PROG. 4+300 a PROG. 6+000
CERTIFICADO N°: 0
FECHA: 1 de Junio de 1993
MES DE: Mayo/93

EMPRESA
PC 50
INSPECCION
Téc. MIGUEL A. CABRE
Inspector de Obras
Prov. de Obras Hidráulicas
M. O. S. P. V.

