

0
H112
E26 plan


46822

COMITE HIDROVIAL TOSTADO

PLAN DE TRABAJOS

SEGUNDA ETAPA DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS

INFORME DE AVANCE



Agosto de 1995

El presente informe surge de la reunión realizada en Tostado (16/8/95) con autoridades del Comité de Cuenca de Tostado, con la presencia del Sr. Lahite, el secretario Técnico M.M.O. Luis Acosta y técnicos de este Convenio.

En la misma se trataron dos temas principales:

- a) El plan de trabajos general a corto y mediano plazo y,
- b) La segunda etapa de la colocación del alcantarillado.

En relación al punto a), se acuerda en general en los criterios técnicos y operativos considerados. Se confeccionará en breve un informe sintético con el plan de obras integral propuesto.

Con respecto al punto b), se establecieron una cantidad de 192 tubos para colocación de alcantarillas para el readecuamiento de los terraplenes de los canales 2, 3, y 4 a colocar en forma inmediata. Esto es en los tramos indicados en el plano adjunto.

Por otra parte, como propuesta del Secretario del Comité Sr. Lahite, se considerarán la colocación de unos 70 tubos en caminos vecinales (ver plano). Estos están sujetos a análisis a los fines de verificar cantidad y ubicación, además de su relación con la red de caminos troncales y secundarios. Su colocación será necesario realizarla de acuerdo al replanteo en el campo del Secretario Técnico.

Con respecto al readecuamiento de los terraplenes de los canales 2, 3 y 4, se adjunta la planilla de replanteo (Planilla 1) de los correspondientes al total del Canal 4 y al sector del Canal 3 correspondientes al tramo I (Río Salado - Ruta 98) (Planilla 3).

Con relación al Canal 4, en su tramo final de (Prog.0+000 hasta el codo , en Prog.8+000 aproximadamente) , se deberán verificar cortes en el mismo, a los fines que no impidan el libre escurrimiento natural (Planilla 2).

CANAL 4

Nº	PROGRESIVA	COTA DESAGUE	CANT.CAÑOS	OBSERVACIONES
1	Camino			
2	13+250	11.00		
3	14+400	10.90		*
4	15+100	11.00		
5	16+000	11.40		*
6	16+600	11.40		*
7	17+000	11.30		antes 16+800 *
8	19+200	11.40		*
9	19+800	11.80		
10	20+400	11.90		
11	21+200	12.00		
	21+791			existente, verif. cota y est.
12	22+700	11.90		*
13	30+600	13.00		en terrapien nuevo

* ya ubicadas en la 1º etapa del alcantarillado variando en algunos casos cota de fondo o progresiva.

PLANILLA 2

Cortes de terraplén - CANAL 4 - Tramo Inferior
(aproximadamente 5 m.)

PROGRESIVA
1+000
2+000
3+700
4+400
5+200
6+000
7+500


Se consideró en general coincidencia con los cortes existentes.

CANAL 3 - TRAMO INFERIOR

PROGRESIVA	COTA DESAGUE	OBSERV.
2+300	T.N.	*
3+500	67.40	
4+200	67.70	

* a considerar según requerimientos del Propietario lindante.

Verificar tramo hasta Río Salado, en relación a la existencia de terraplén discontinuo.

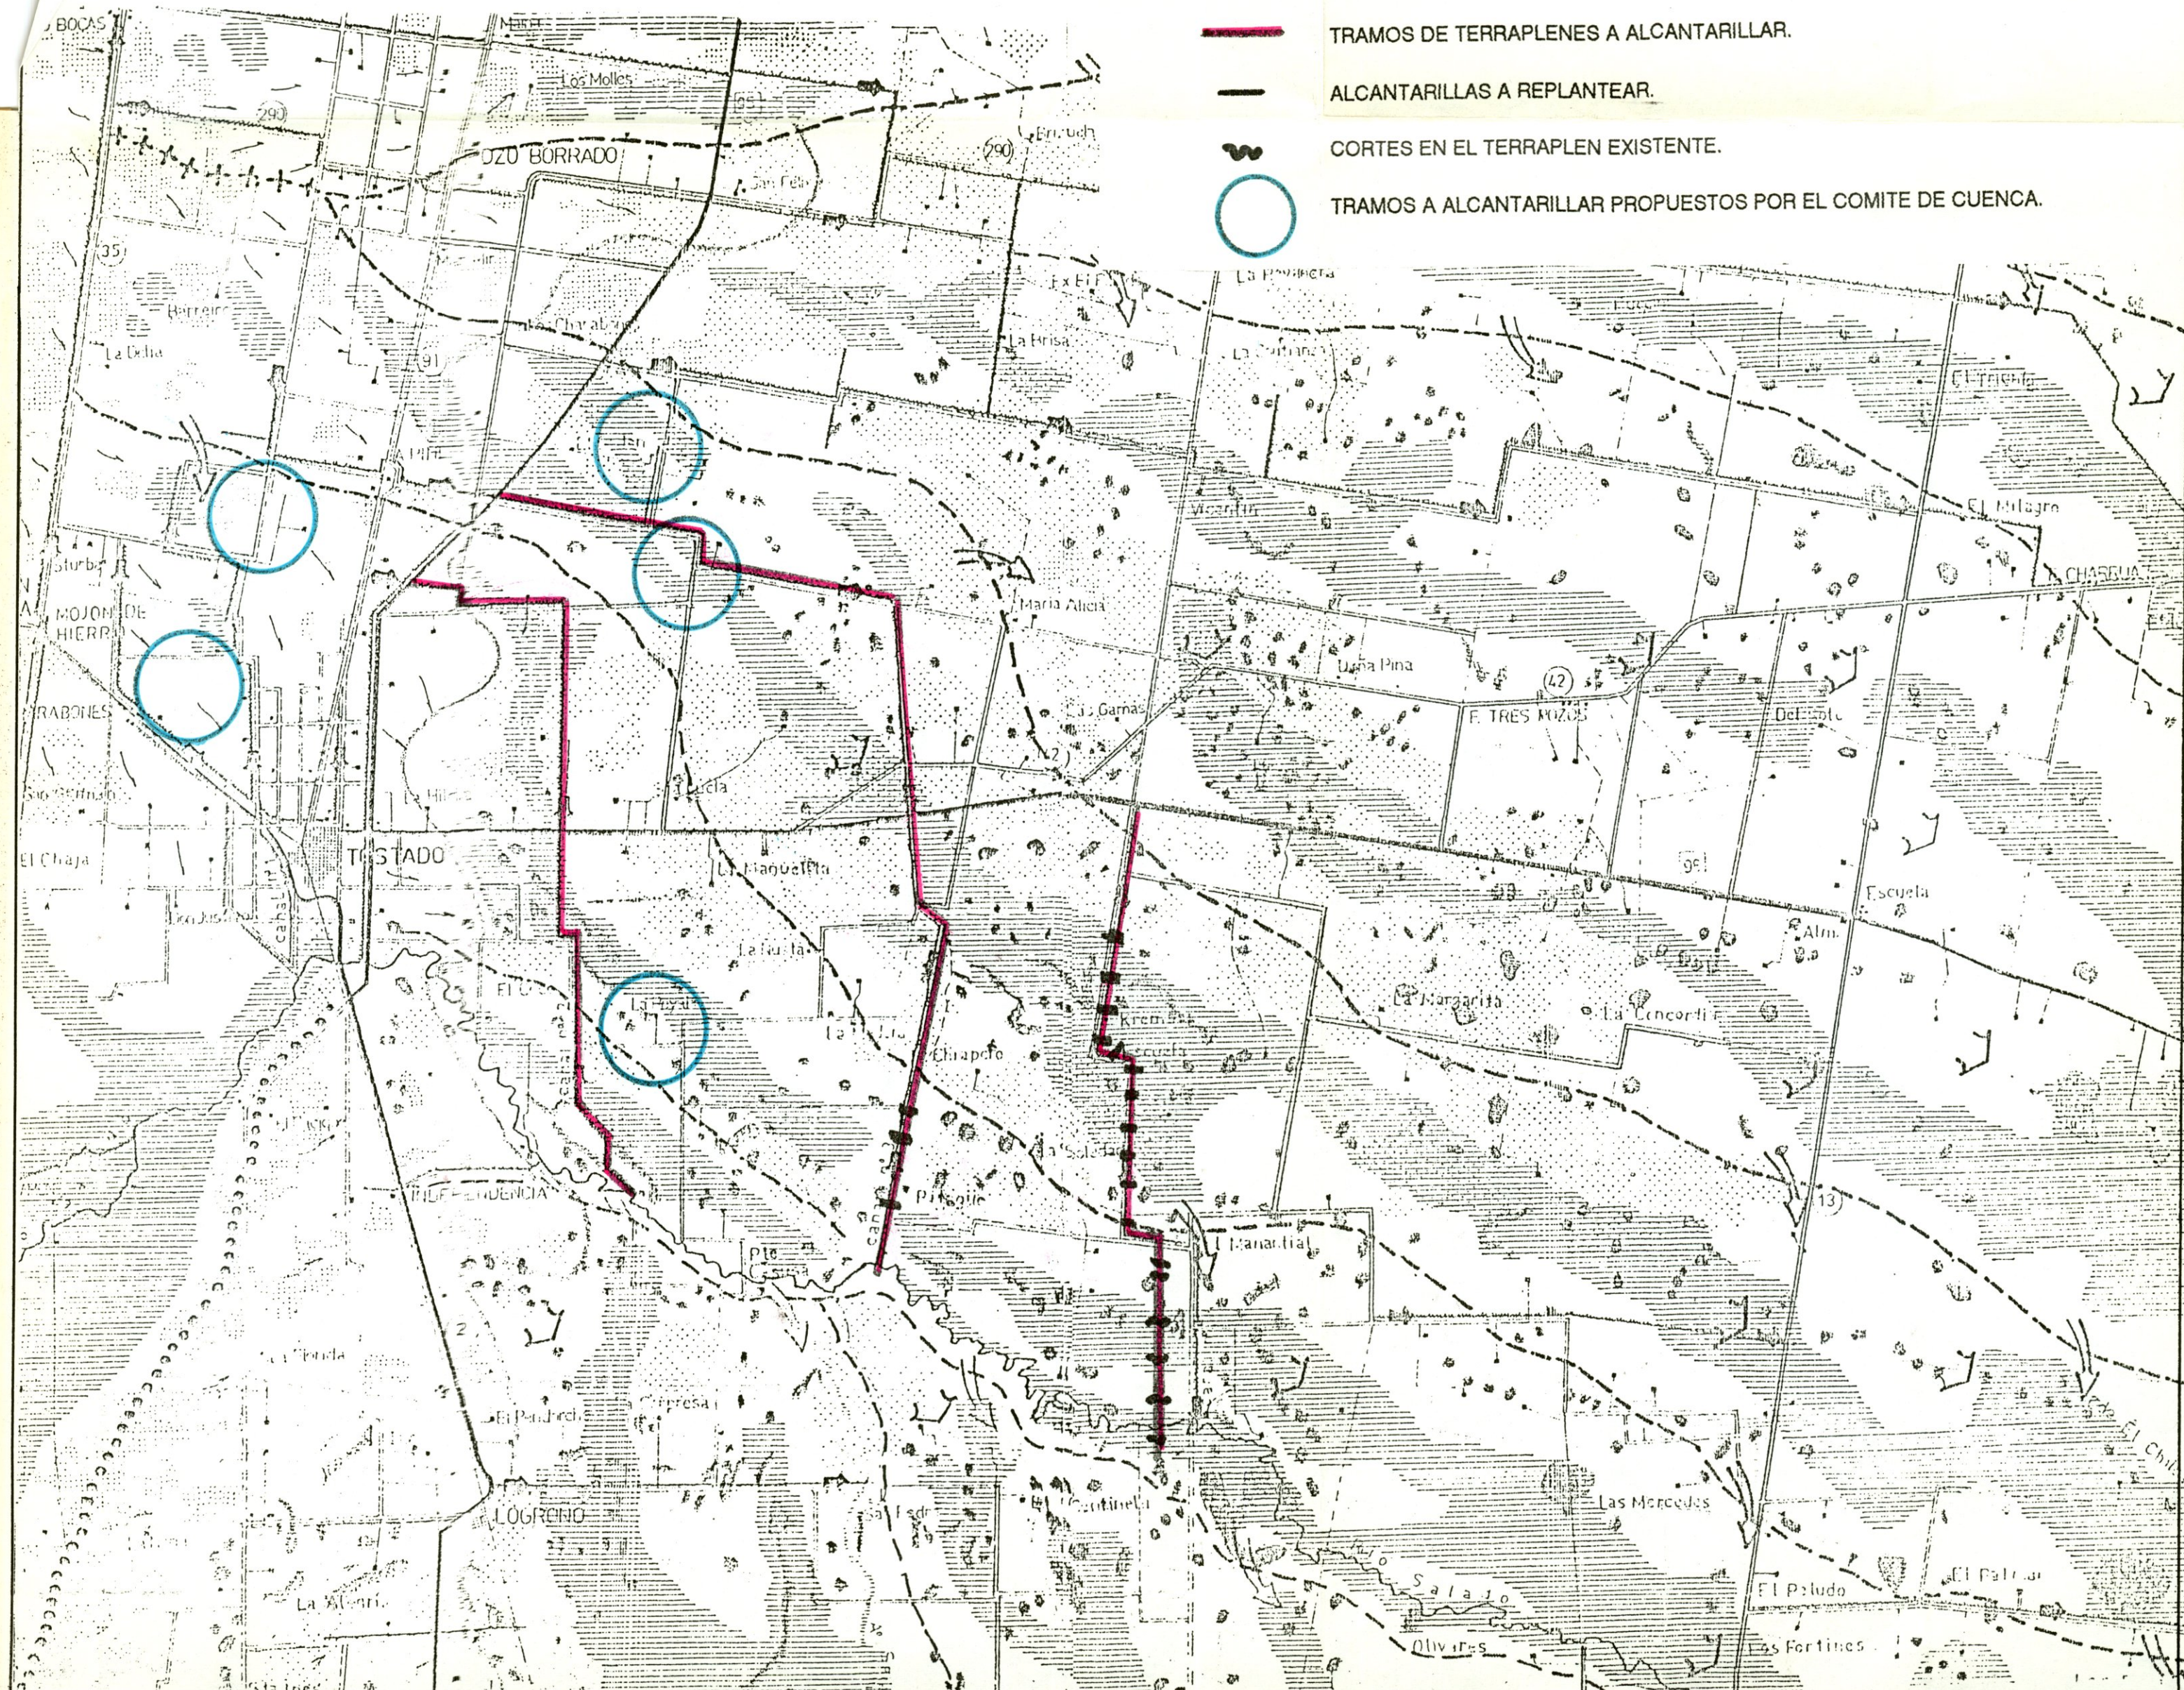

TRAMOS DE TERRAPLENES A ALCANTARILLAR.

ALCANTARILLAS A REPLANTEAR.

CORTES EN EL TERRAPLEN EXISTENTE.

TRAMOS A ALCANTARILLAR PROPUESTOS POR EL COMITE DE CUENCA.

BOCAS

Los Molles

OZO BORRADO

TOSTADO

LOGREÑO

INDEPENDENCIA

MOJON DE HIERRO

La Chajá

Los Molles

Maria Alicia

Chiapote

Manarital

Las Mercedes

Salazar

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines

E. TRES RIZOS

La Margarita

La Concoria

Las Mercedes

Salazar

Olivares

La Pinarera

La Frisca

Una Pina

J. Gamas

La Maguallita

La Lujula

Pragón

San Martín

El Paludo

Los Fortines
